JAHRESERTRAG 2013
SOLARSTROMANLAGE

SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST
SCHRECKERT

ANLAGENDETAILS	
Anlage	Poly 05
Anlagenstandort	36211 Alheim-Baumbach
Ausrichtung	Süd (-10°)
Dachneigung	40°
Solarmodule	30 REC - SCM 210 - 220 Wp
Anlagenleistung	6,60 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 3800, 1x SMA SB 2500
Inbetriebnahme	2008-03-07

MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG [kWh/kWp]	[%]	ERTRAGSPROGNOSE [kWh/kWp]	[%]
Januar		10,82	1,25	25,61	3,02
Februar		27,47	3,18	52,88	6,24
März		80,36	9,29	74,24	8,76
April		92,71	10,72	92,73	10,94
Mai		88,00	10,18	109,55	12,93
Juni		118,09	13,66	100,46	11,85
Juli		141,14	16,32	104,24	12,30
August		118,06	13,65	102,42	12,08
September		83,19	9,62	77,12	9,10
Oktober		55,65	6,44	57,27	6,76
November		25,44	2,94	26,97	3,18
Dezember		23,87	2,76	24,09	2,84
Gesamtsumme		**864,80**		**847,58**	

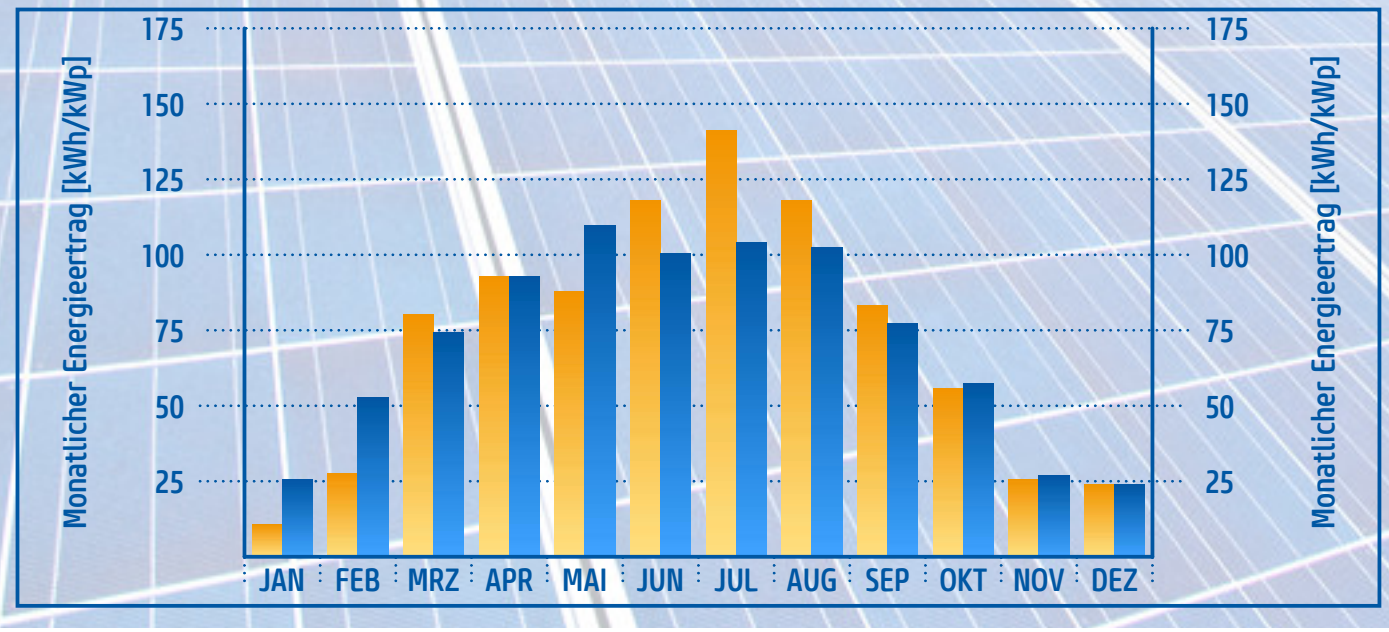

Irrtum und Änderungen vorbehalten • Alle Rechte vorbehalten • © Schreckert, 2013

Schreckert GmbH
Solartechnik • Heizung • Sanitär • Kundendienst
Unterer Semmetweg 1
34311 Naumburg-Altenstädt
Telefon: (0 56 25) 92 39 50
E-Mail: info@schreckert.de
Internet: www.schreckert.de
www.facebook.com/schreckert
